

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/10～2019/11）

□令和元年 10 月



10 月 1 日


杭打機（緑色の重機）で地盤改良工事を開始しています。



10 月 7 日

引き続き地盤改良工事を進めています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/10～2019/11）

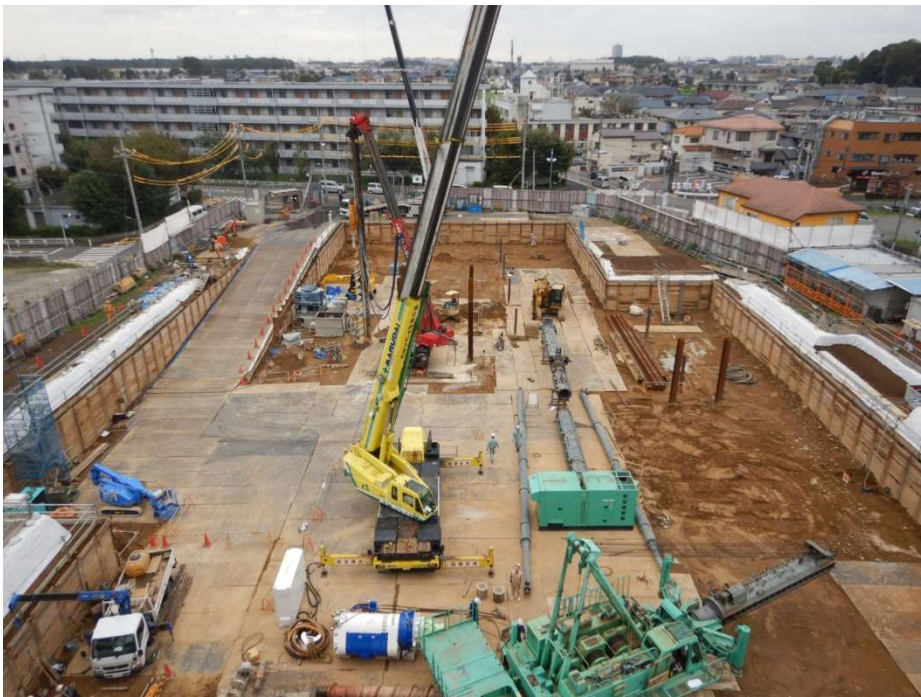

10月24日

地盤改良工事が完了し、杭打機（手前緑色の重機）の解体を行っています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/10～2019/11）

□令和元年 11 月



11 月 1 日

山留め壁の変形を抑えるため、山留め支保工の設置作業を行っています。
同時にダンプトラック・クレーン等の乗入れ構台の設置作業を行っています。



11 月 18 日

山留め支保工、構台の設置が共に完了し 2 次掘削を開始しています。
