



■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/12～2020/2）

□令和元年 12 月

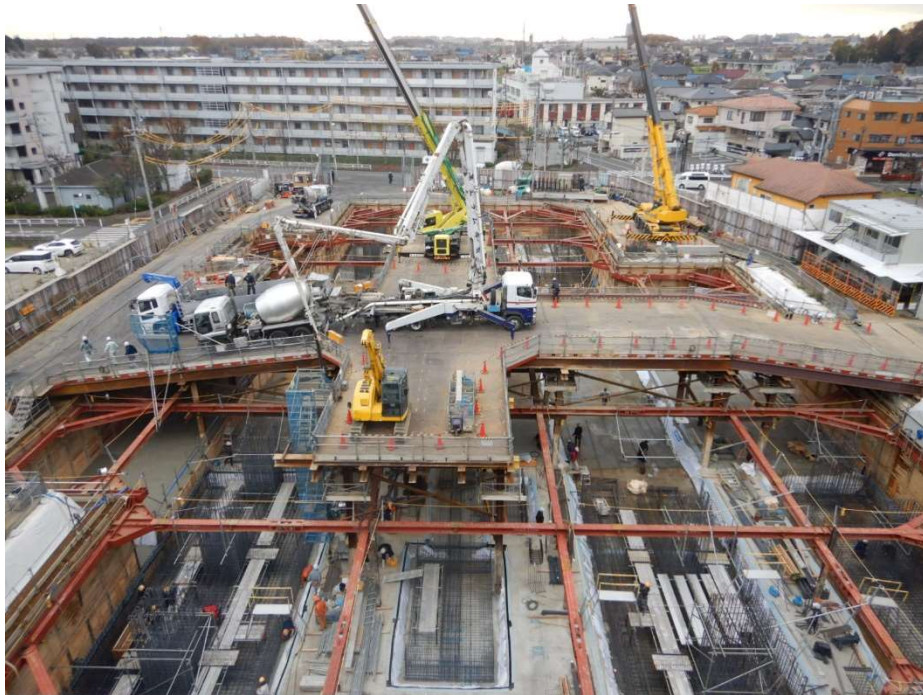

12 月 9 日


2 次掘削が完了し地下ピット部分の配筋を開始しています。

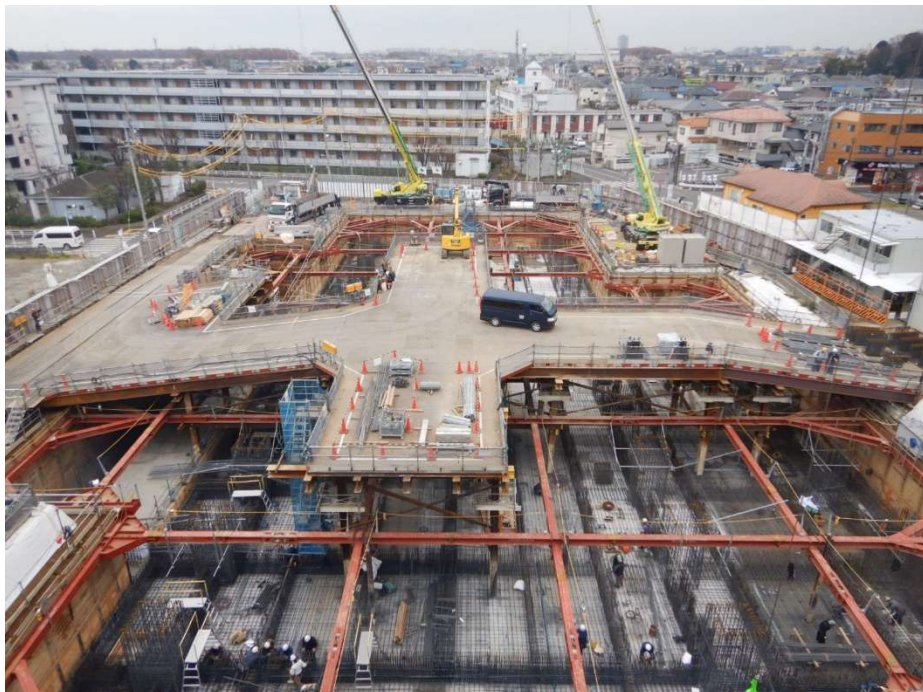

12 月 19 日

引き続き地下ピットの配筋を行っています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/12～2020/2）

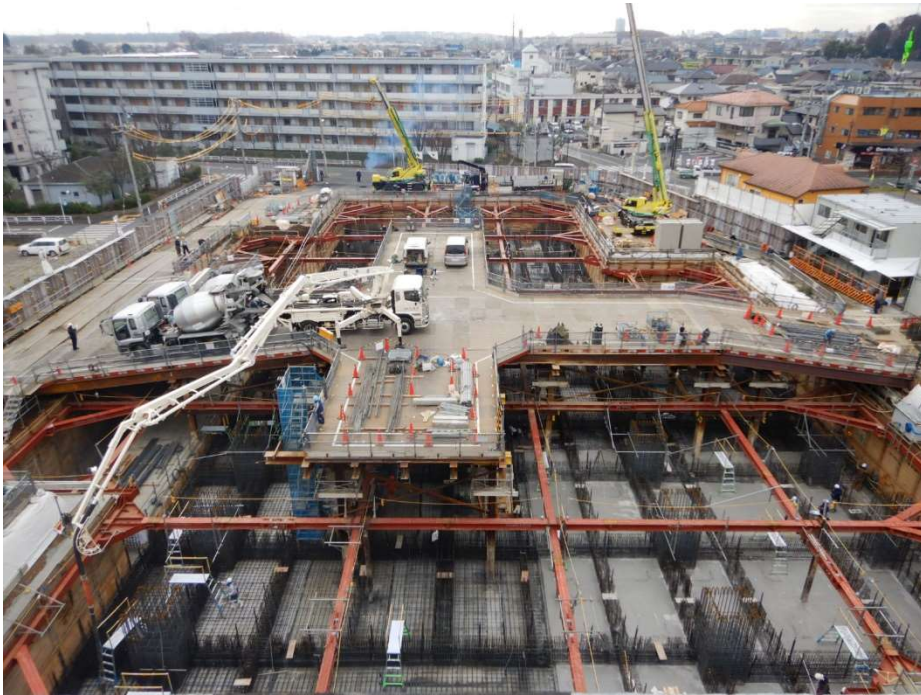

12月25日

配筋が完了した部分にコンクリートの打設を行っています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/12～2020/2）

□令和 2 年 1 月



1 月 7 日

写真奥側の配筋を行うと同時に、配筋が完了した部分にコンクリートの打設を行っています。



1 月 22 日

写真手前側の地下ピットの床・壁のコンクリートの打設が完了しました。


■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2019/12～2020/2）

令和 2 年 2 月



2 月 4 日

地下 1 階の床部分の配筋を行っています。

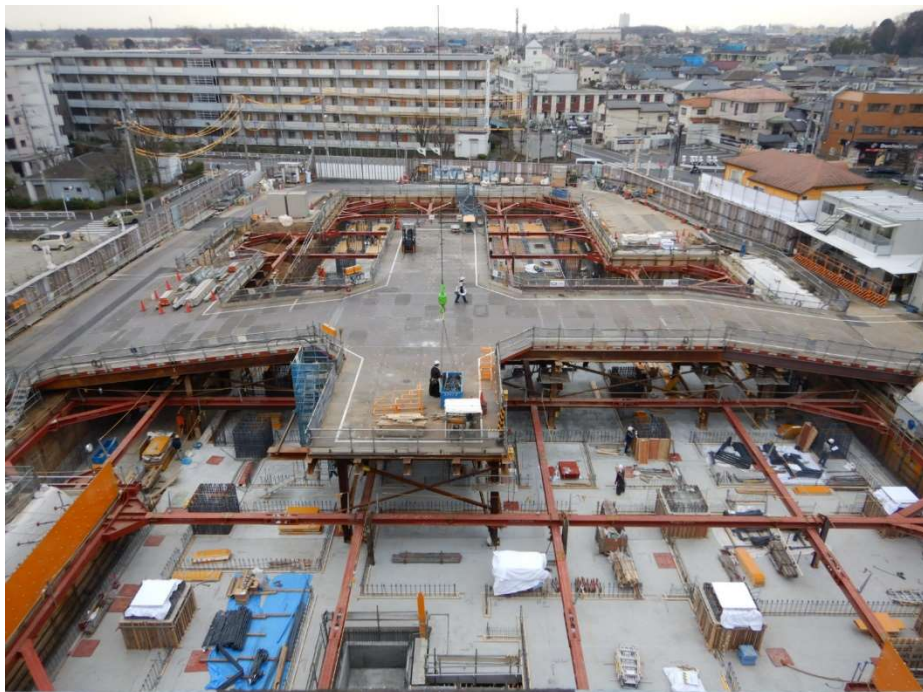

2 月 13 日

写真手前側の地下 1 階床部分のコンクリートの打設が完了しました。
柱の配筋が完了した部分から型枠を設置しています。
