


■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/3～2020/5）

□令和 2 年 3 月



3 月 4 日

地下 1 階の床のコンクリート打設が完了しました。

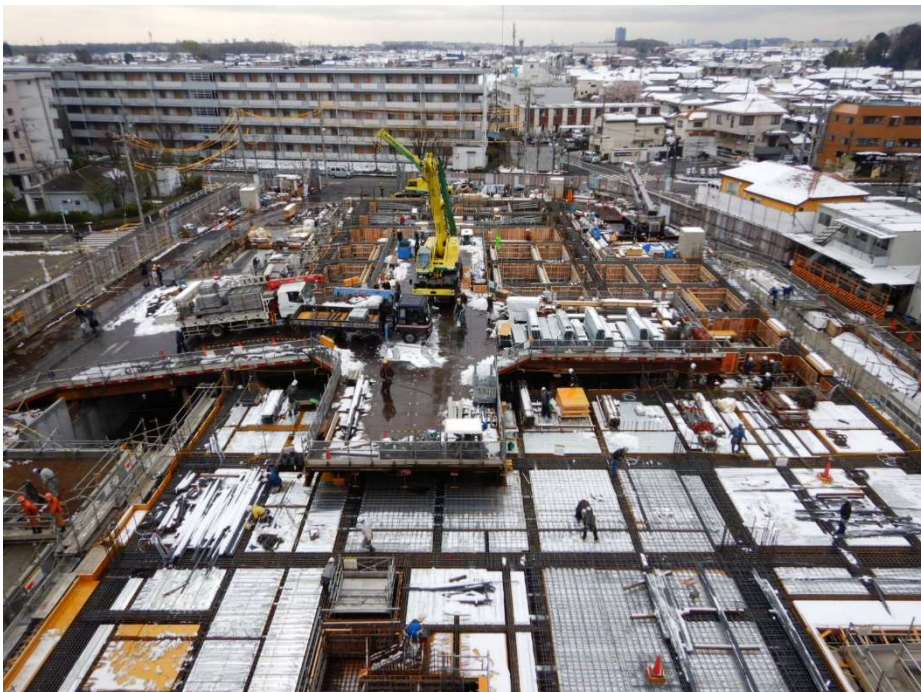

3 月 30 日

前日の雪で現場にも雪が積もりました。
現場では朝から除雪作業を行っています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/3～2020/5）

□令和 2 年 4 月



4 月 3 日

1 階床の配筋が完了した部分にコンクリート打設を行っています。



4 月 9 日


現場が進み中央の構台が現場作業と干渉する為、構台の撤去を行っています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/3～2020/5）



4月17日

1階床のコンクリート打設が完了し、2階床の型枠設置作業を行っています。

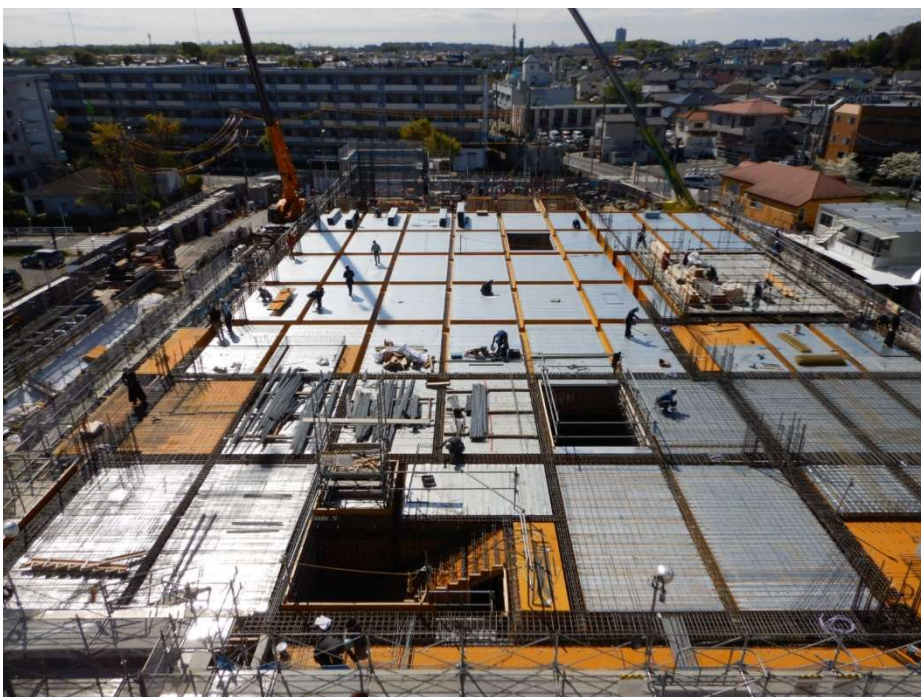

4月22日

2階床の型枠作業と同時に写真手前側から配筋を行っています。

■ 清瀬市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/3～2020/5）

□令和 2 年 5 月



5 月 12 日

写真奥側の配筋を行うと同時に、配筋が完了した部分にコンクリートの打設を行っています。



5 月 25 日

2 階のコンクリート打設が完了し、3 階床の型枠作業を行っています。
