

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/6～2020/8）

□令和2年6月



6月3日

3階床の型枠作業と同時に写真手前側から配筋を行っています。



6月12日

3階床のコンクリート打設が完了し、4階床の型枠作業を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/6～2020/8）



6月18日

4階床の型枠作業と同時に写真手前側から配筋を行っています。




6月26日

屋上階の施工を行うための足場が設置されました。
外壁の仕上げが完了した後、足場が撤去される予定です。


■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/6～2020/8）

□令和2年7月

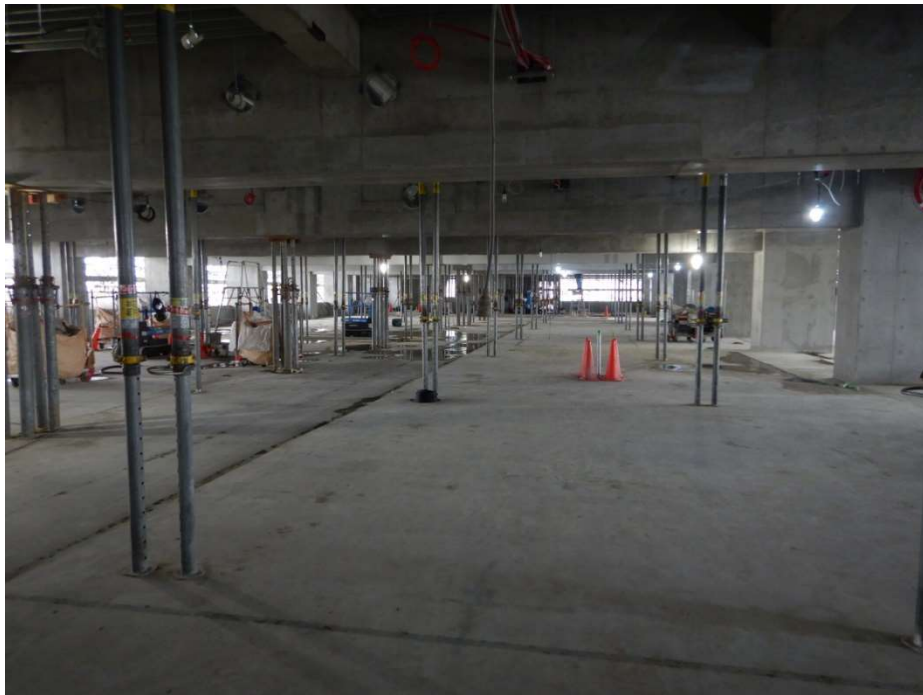

7月21日

3階建物内部の状況です。建物北側から南側を撮影しています。

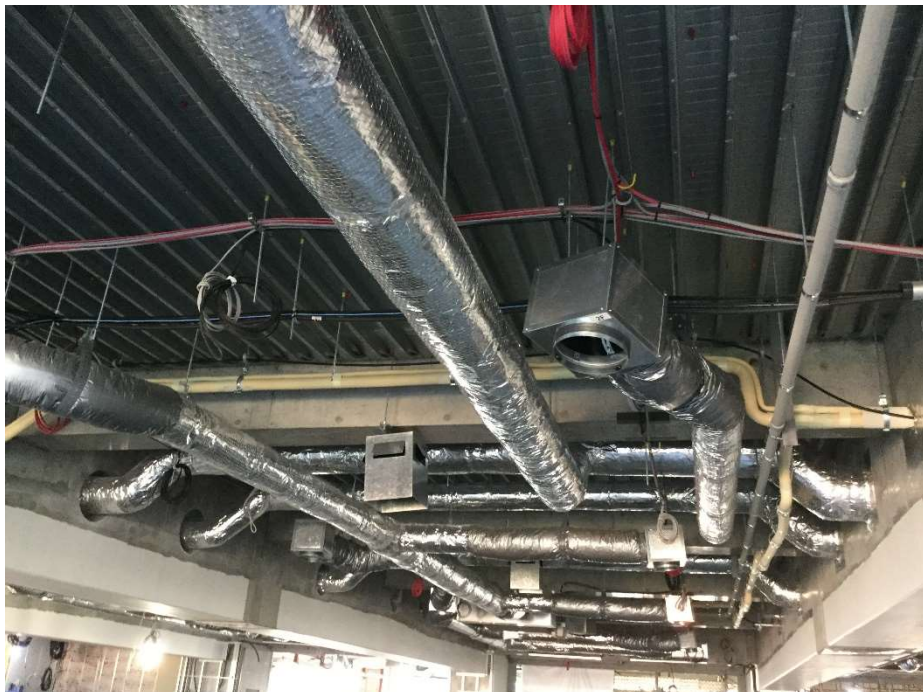

7月29日

2階建物内部の状況です。設備の配管作業を行っています。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/6～2020/8）

□令和2年8月



8月6日

上空より撮影した写真です。



8月11日


屋上階のコンクリート打設が完了しました。

■ 市新庁舎建設工事 工事現場状況報告（2020/6～2020/8）



8月21日

1階から2階へ上がる内部鉄骨階段の設置状況です。

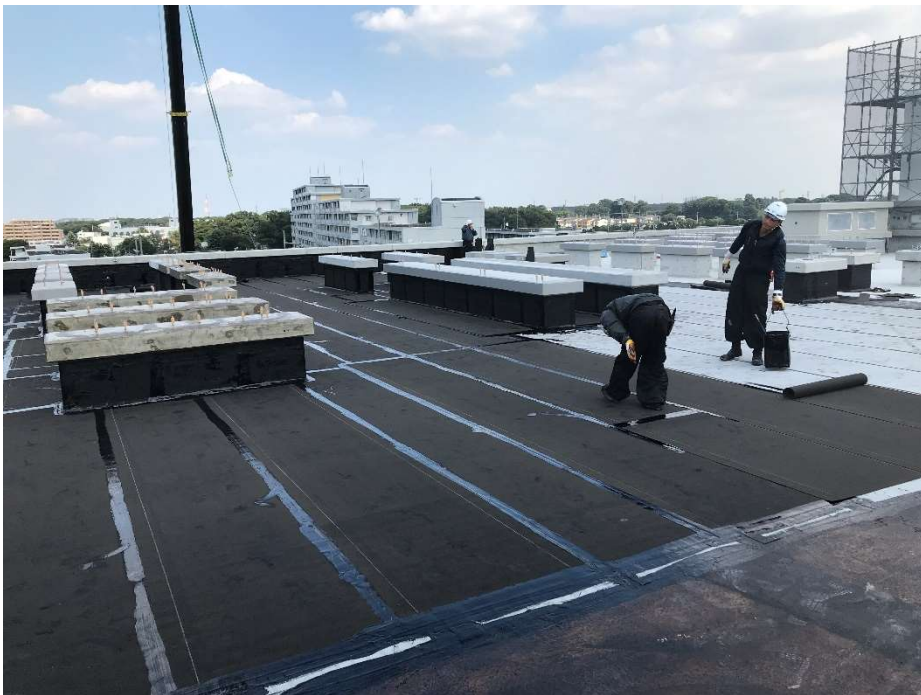

8月25日

屋上階の防水工事を行っています。
